

Приложение 1. Архитектура проекта

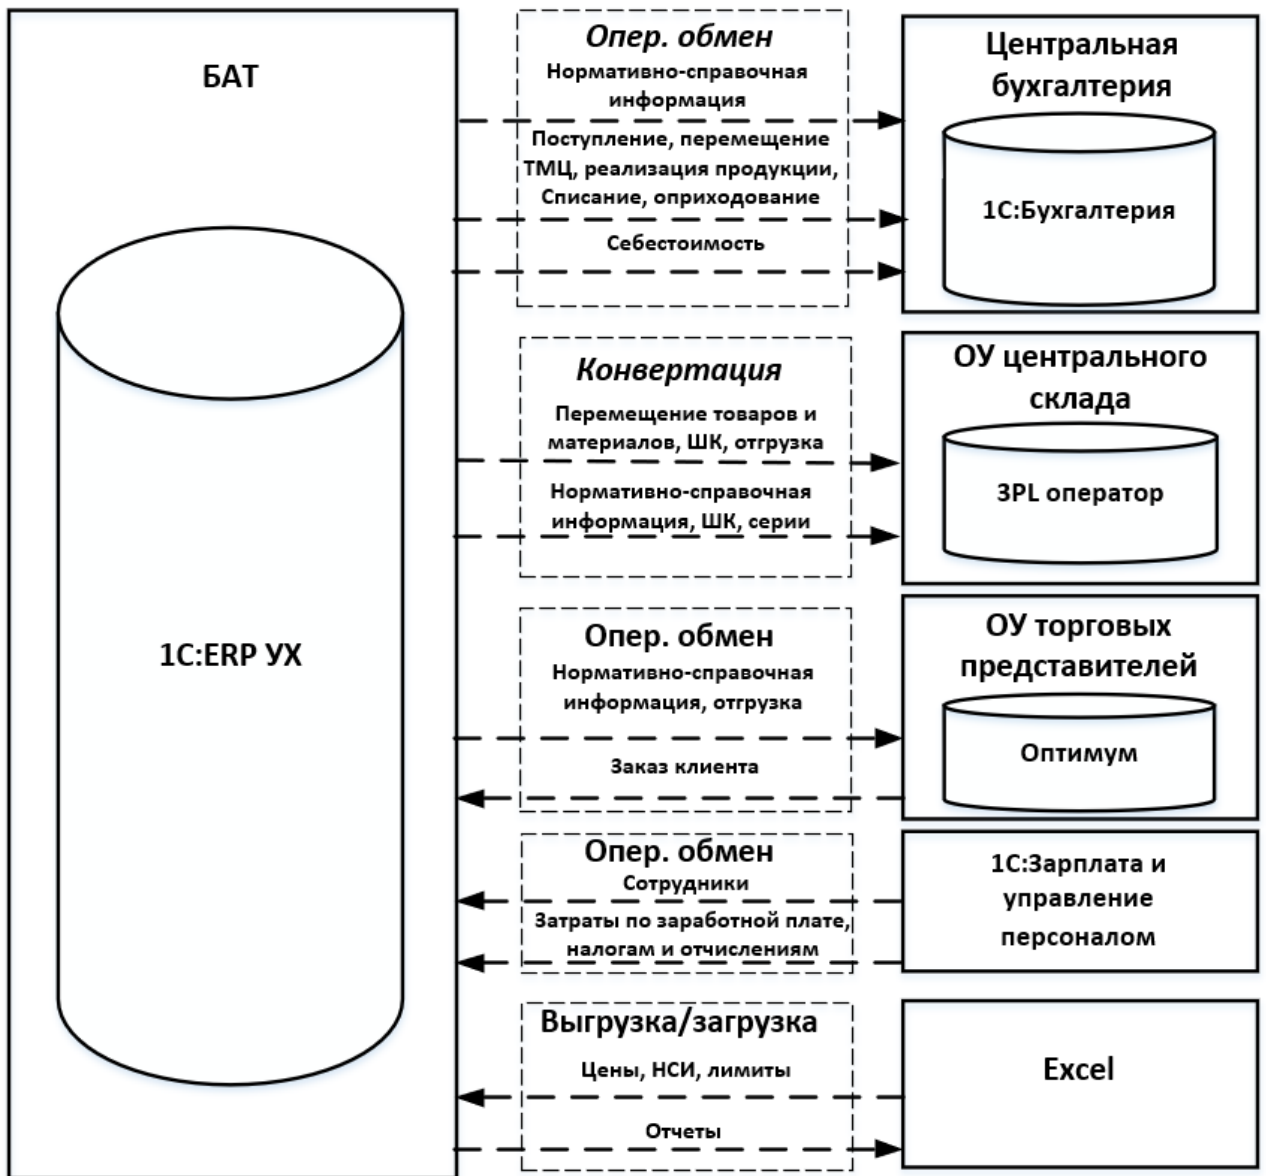


Рисунок 1 Схема архитектурного решения на базе Комплекса программ 1С во внутренней архитектуре заказчика

Приложение 2. План-график проекта

План-график проекта: ERP и БП

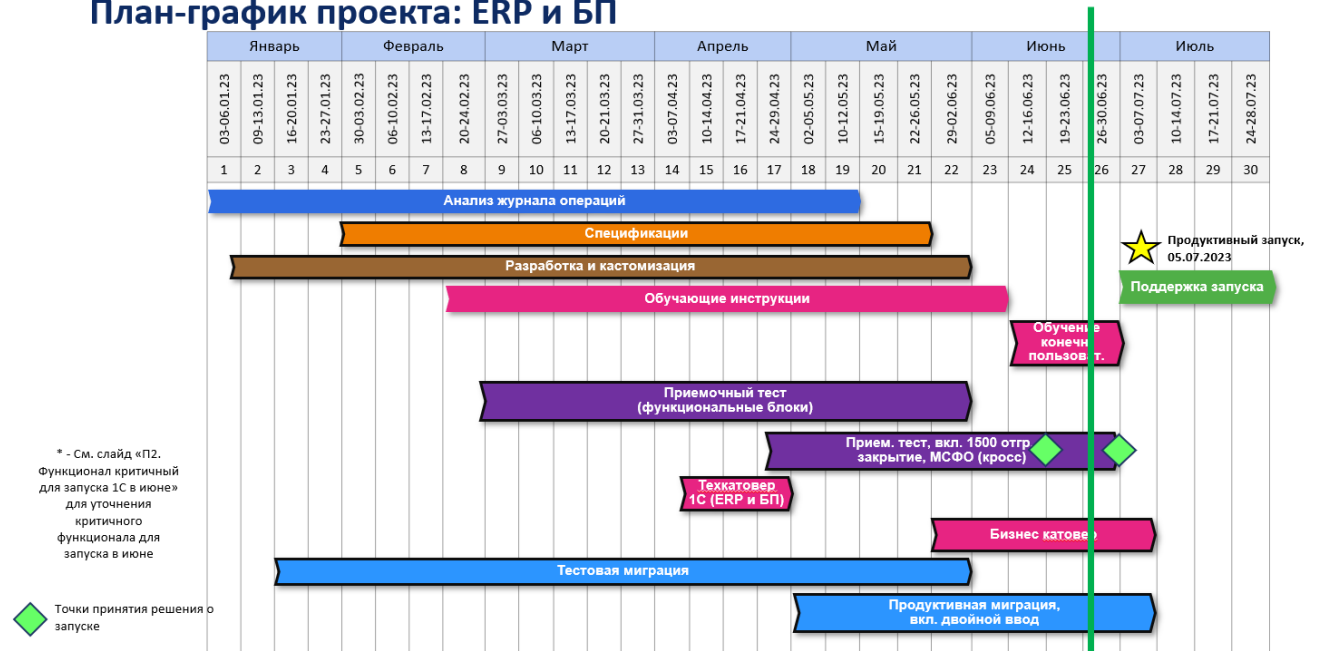


Рисунок 2 План-график работ по проекту до продуктивного запуска

Приложение 3. План-график сквозного тестирования

2.1 План-график проекта: сквозное тестирование

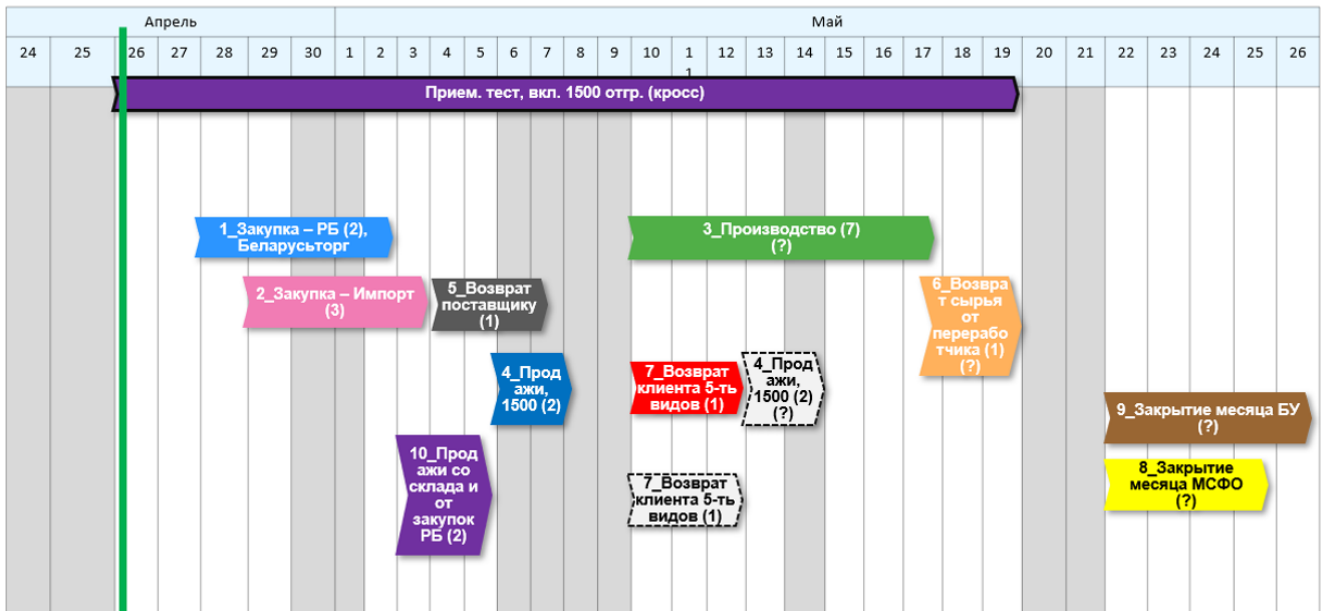


Рисунок 3 Детальный план-график тестирования системы перед продуктивным запуском

Приложение 4. Трекер задач продуктивного запуска системы

№	Задача	Статус	Комментарий
1	Конечные пользователи обучены работе с системами 1С (ERP, ЗУП, БП) и Оптимум	Выполнено с ограничениями	Не обучены по БУ и НУ, 3-4 курсы в 1С (топким, МСФО и др.)
2	Обучающие инструкции и видеоролики по 1С и Оптимуму выложены на общедоступном источнике, ссылки разосланы пользователям	Выполнено	
3	Технически подготовлены системы 1С (ERP, ЗУП, БП) и Оптимум: разработки, настройки, роли, регламентные задачи и др.	Выполнено с ограничениями	В Оптимуме есть проблемы, которые решаются сейчас. Но они на блокируют первые заказы и отгрузки 04.07
4	Программное обеспечение по регистрации дефектов ТикиТрик работоспособно и доступно к работе с 1С для БАТ и Юколы	Выполнено	
5	Пользователям присвоены роли и полномочия в 1С-системах (ERP, ЗУП, БП) и Оптимум	Выполнено с ограничениями	Нужна встреча по матрице ролей с топким, вкл. функции МСФО. Сейчас вопросы по ролям и доступам решаем через процедуру поддержки с Юколой
6	Включена и функционирует интеграция между системами 1С (ERP, ЗУП, БП) и Оптимум	Выполнено с ограничениями	1С ок, для Оптимума интеграция не включена. Технически интеграция будет включена с Оптимумом, после решения техпроблема. Это не блокирует первые сбытовые заказы, запланированные на 04.07.2023
7	Выполнена миграция необходимых для продуктивного запуска данных НСИ и остатков по счетам в системах 1С и Оптимум	Выполнено	
8	Успешно проведен эмуляционный тест работы в продуктивных 1С и Оптимум, устранены критичные дефекты (интеграция, отгрузки, закупки)	Выполнено	
9	Согласован и распространен пользователям подход к продуктивной поддержке запуска систем 1С и Оптимум (вопросы, дефекты, запросы на изменения и ВСП)	Выполнено	
10	Устранены критичные дефекты или для них определены и согласованы «обходные пути» работы в 1С (Workaround) (см. слайд 1)	Выполнено с ограничениями	См. слайд 1
11	Выполнены активности в SAP/Галактика из бизнес-катовера (вкл. закрытие), отправлена коммуникация о последующих первых активностях в 1С (см. слайд 2)	Выполнено с ограничениями	См. слайд 2

Согласованное решение: Коллективное решение от БАТ и Юколы: да, мы готовы к продуктивному запуску систем 1С и Оптимум с 04.07.2023 с учетом ограничений выше

Рисунок 4 Перечень задач, которые должны быть выполнены до продуктивного запуска
